PRÉSENTATION

PROJET WEB FULLSTACK

1. SPEC DRIVEN DEVELOPMENT
2. CHOIX DES AGENTS
3. DÉROULEMENT ET AMÉLIORATIONS DU PROJET

SPEC DRIVENT DEVELOPMENT

- Rédaction de fichier cahier_des_charges.md
- Review par l'IA
- Génération du fichier PLAN_IMPLEMENTATION.md et AGENTS.md

```md

# Objectif
Je compte faire une plateforme de streaming privee pour regarder mes films et séries.
...

## Fonctionnalites
...

## Technique
...

### Technologies utilisees
...

## Securite
...

## Methodologie
### Frontend
...

### Backend
...

## Variables d'environnement
...
## Donnees
...
### Versions du modele
...
## Design
...

## Versions

### V1
...
### V2
...
### FUTUR
...

```

SPEC DRIVEN DEVELOPMENT

```md
# Plan d'implementation

## Hypotheses de travail ···

## Ordre de priorite recommande

1. Construire un socle technique stable.
2. Livrer une V1 exploitable autour de l'authentification, du catalogue, du streaming et de l'upload de fil
3. Ajouter les suggestions et l'administration avancee.
4. Ouvrir la V2 avec les series, les notifications et les profils publics.

## Vue d'ensemble des phases

- Phase 0 - Cadrage technique et socle du projet
- Phase 1 - Authentification et gestion utilisateur
- Phase 2 - Catalogue medias et consultation
- Phase 3 - Upload de films et streaming
- Phase 4 - Interactions utilisateur et profil
- Phase 5 - Suggestions et administration
- Phase 6 - Stabilisation et release V1
- Phase 7 - V2 series et notifications
- Phase 8 - V2 profils publics et recherche utilisateurs

## Phase 0 - Cadrage technique et socle du projet

### Objectif

Poser une base de travail propre pour eviter les reworks structurels lors des phases metier.

### Sprint 0.1 - Initialisation du projet

Objectifs:

- Initialiser la structure du repository avec au minimum `front/`, `back/`, `documentation/`.
- Creer le `docker-compose.yml` avec PostgreSQL, backend et frontend.
- Definir les fichiers `.env.example` frontend et backend.
- Mettre en place le lint, le formatage et les conventions de nommage.
- Ecrire un README de bootstrap local.

Sorties attendues:

- Le projet demarre localement avec Docker Compose.
- Le backend expose une route `GET /health`.
- Le frontend affiche une page de shell vide ou une page temporaire.

### Sprint 0.2 - Architecture applicative

Objectifs:
```

Plan d'implémentation:

- Objectifs du projet
- Plan détaillé de la construction du projet par sprints

```md
# CLAUDE.md

## Objet du projet

StreamAdy est une plateforme de streaming privee auto-hebergee.

Stack ciblee:

- Frontend: React + Vite
- Backend: Node.js + Express
- Base de donnees: PostgreSQL + Prisma
- Documentation API: Swagger
- Infra locale: Docker Compose

Les medias sont stockes localement sur le serveur via des chemins de fichiers.

## Sources de verite ···

## Etat actuel du workspace ···

## Regles de cadrage

- L'authentification doit rester `username/password` uniquement tant qu'une consigne contraire n'est pas donn
- Ne pas introduire OAuth ou des providers externes sans demande explicite.
- Conserver le stockage local des medias comme hypothese par defaut.
- Ne pas introduire de cloud storage, CDN ou transcodage complexe sans validation utilisateur.
- Respecter la roadmap V1 -> V2 -> V3 au lieu d'implementer toutes les fonctionnalites d'un coup.

## Priorite de developpement ···

## Conventions backend ···

## Conventions frontend ···

## Conventions donnees ···

## Facon de travailler pour un agent IA

- Commencer par inspecter l'etat du workspace avant de proposer une solution.
- Si la tache est importante, annoncer un plan court puis executer.
- Faire des changements incrementaux et verifiables.
- Ne pas inventer des fonctionnalites absentes du cahier des charges.
- Si une ambiguite bloque, la signaler clairement avec une proposition concrete.
- Mettre a jour la documentation quand une decision de structure, de schema ou d'API change.

## Livrables attendus pendant le developpement ···

## Definition of done minimale ···
```

Fichier CLAUDE.md:

- Objectifs du projet et du document
- Règles et Méthode de travail lors de sollicitations

CHOIX DES AGENTS

Domaine

Génération des fichiers de doc:

Domaine

Développement, code, conseils choix techniques

Domaine

Design de l'interface

DÉROULEMENT ET AMÉLIORATIONS DU PROJET

Fichier structuré pour organiser mes demandes, il montre à l'agent:

- Les fonctionnalités à ajouter si elles ne sont pas précisées dans le cahier des charges
- Ce qu'il doit corriger : bugs, mauvaise compréhension de mes demandes…
- Questions auxquelles il doit répondre

```md
# CORRECTIONS.md

## Objet du document

- Ce document contient toutes les remarques, corrections, Bugs... à prendre en compte pour améliorer l'application.

### Mission

- Corriger Bug(s)
- Répondre aux Questions dans le chat claude
- Implémenter les nouvelles fonctionnalités et les ajouter au cahier des charges.

### Bugs

-

### Questions

-

### Nouvelles fonctionnalités

-
```

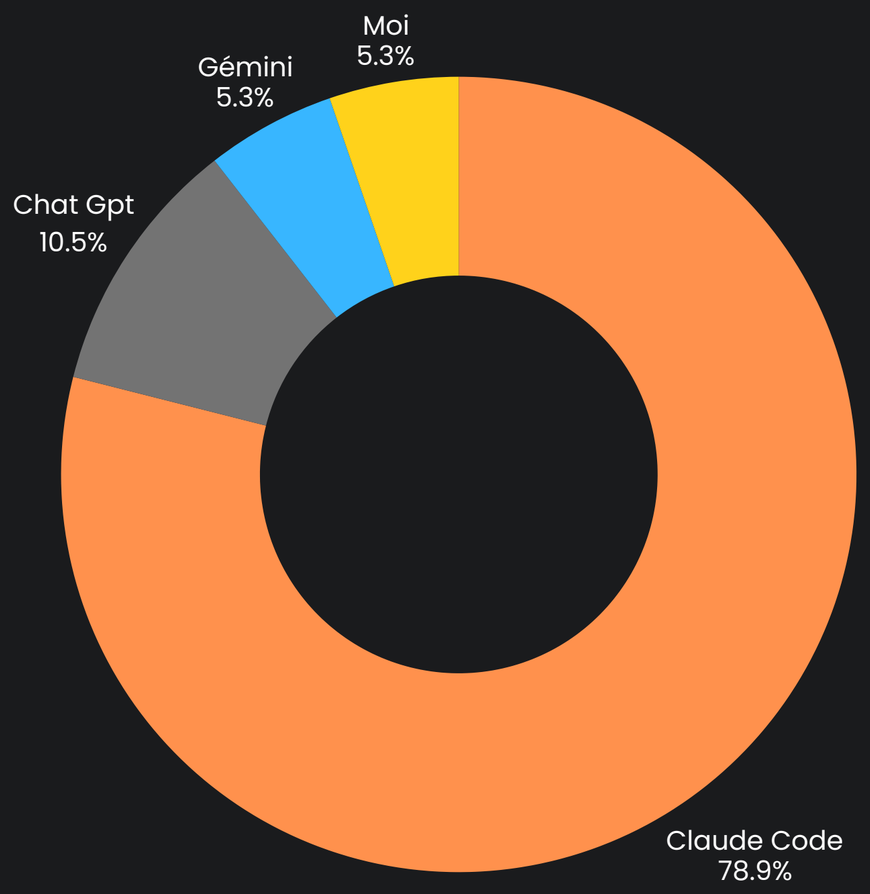

PARTS DES AGENTS DANS LA GÉNÉRATION DE CODE

MERCI !
